ΥΠΠΟ - ΕΣΜΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Η.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΜΜΑΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1977

Φ.30/7

ΜΙΤΡΩΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Π.ΕΙΣ. 72

ΑΡ.ΕΥΡ.

Ανάθεση η. Τριανταφυλλίδη
το θέμα. Ενημέρωση
από η. Ενημέρωση
η. Πολυκανδρίου

Εγκύκλιο
μετά ίδρυσης
22-9-77

Πρός

Τήν Ὁμάδα Ἐργασίας Συντηρήσεως Μνημείων
Ἀκροπόλεως

ΘΕΜΑ : Γαμμαγραφίες τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν "Δημόκριτος" σέ τμήματα τοῦ Ἐρεχθείου

Γίνεται γνωστό στήν Ἐπιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ἀκροπόλεως ὅτι σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἐρευνῶν γιά τόν προσδιορισμό τῆς ὑπάρξεως καί τῆς σημερινῆς καταστάσεως συνδετήριου ὑλικοῦ πού χρησιμοποιήθηκε κατά τίς ἀναστηλώσεις 1837-45 καί 1902-1909, ἔγιναν οἱ ἑξῆς συνεννοήσεις μεταξύ τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου Μελέτης καί τοῦ Συνεργείου Γαμμαγραφίας τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν "Δημόκριτος" :

1.Ἀποκλείστηκε κατ'ἀρχήν ἡ ἄποψη γιά ἐκτεταμένες ἀκτινοσκοπήσεις στό Νότιο τοῖχο δεδομένου ὅτι μιά τέτοια προσπάθεια θά ἀπαιτοῦσε μεγάλο χρονικό διάστημα καί θά ἀπέβαινε ἀρνητική γιά τόν γενικότερο προγραμματισμό τῶν μελετῶν πού ἐξελίσσονται ἐπί τοῦ μνημείου.

2.Ἀποφασίστηκε ἡ ἀκτινοσκόπηση μιᾶς μόνο κατακόρυφης ζώνης μικροῦ πλάτους -περίπου 1,00μ.-, στό μέσον τοῦ Νότιου τοίχου μέ σκοπό νά διαπιστωθεῖ κατά πόσον ἔγινε χρήση συνδετήριου ὑλικοῦ ἀπό τόν Πιττάκη καί ὅσο ἀφορᾶ τίς δύο ἀναστηλώσεις -Πιττάκη καί Μπαλάνου- κατά πόσον ἔγινε χρήση καί γόμφων.

3.Ἀποφασίστηκε ἡ ἀκτινοσκόπηση σέ 6 χαρακτηριστικά σημεία τοῦ τμήματος τοῦ Νότιου τοίχου πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν Πρόσταση Τῶν Κορῶν.Τό τμῆμα αὐτό διατηρεῖ ἀκόμα τήν ἀρχαία δομή του καί θεωρήθηκε κατάλληλο γιά πειραματική ἔρευνα σχετική μέ τόν προσδιορισμό τοῦ βαθμοῦ διαβρώσεως τῶν ἀρχαίων σιδερένιων στοιχείων -γόμφων καί συνδέσμων-.Ἡ ἔρευνα αὐτή θεωρήθηκε τότε ἐξαιρετικῆς σημασίας γιά τήν τεκμηρίωση τῆς σημερινῆς καταστάσεως τμημάτων τοῦ μνημείου πού διατηροῦν τήν ἀρχαία δομή τους.

4. Ἀποφασίστηκε τέλος ἡ διενέργεια ἀκτινοσκοπήσεων στήν 3η, ἀπό δυτικά, φατνωματική πλάκα τῆς ὀροφῆς τῆς Προστάσεως τῶν Κορῶν, ἡ ὁποία ὅπως εἶναι γνωστό καταστράφηκε ἀπό πτώση καί ἀποτελεῖται ἀπό 5 κομμάτια συνδεδεμένα μέ σιδερένια στοιχεία. Σκοπός τῶν ἀκτινοσκοπήσεων θεωρεῖται ὁ προσδιορισμός τῆς θέσεως καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σιδερένιων συνδετικῶν στοιχείων πού σήμερα εἶναι ἄγνωστη.

Τή στιγμή αὐτή ἔχει ἤδη ὁλοκληρωθεῖ τό σκέλος 2 τῶν παραπάνω ἐργασιῶν μέ ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα καί ἕνα μέρος τοῦ σκέλους 3. Τά ἀποτελέσματα στήν περίπτωση αὐτή εἶναι δυνατό νά ἀποδώσουν μέ συγκριτική μελέτη συμπεράσματα γιά τήν κατάσταση τοῦ ἀρχαίου συνδετήριου ὑλικοῦ, ἀλλά θεωρεῖται σκόπιμο ἀπό τό Τεχνικό Γραφεῖο Μελέτης νά μή συνεχιστοῦν οἱ ἀκτινοσκοπήσεις σέ ὅλα τά σημεῖα -6- πού εἶχαν ἀρχικά ὑποδειχτεῖ. Προτείνεται λοιπόν ἡ ἄμεση διακοπή τῶν ἀκτινοσκοπήσεων καί ἡ μεταφορά τῶν μηχανημάτων στήν Πρόσταση τῶν Κορῶν γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ 4 σκέλους.

Ἀθήνα 22-9-77

Γιά τό Τεχνικό Γραφεῖο Μελέτης

Ἀ. Παπανικολάου

Ἡ. Μουτόπουλος

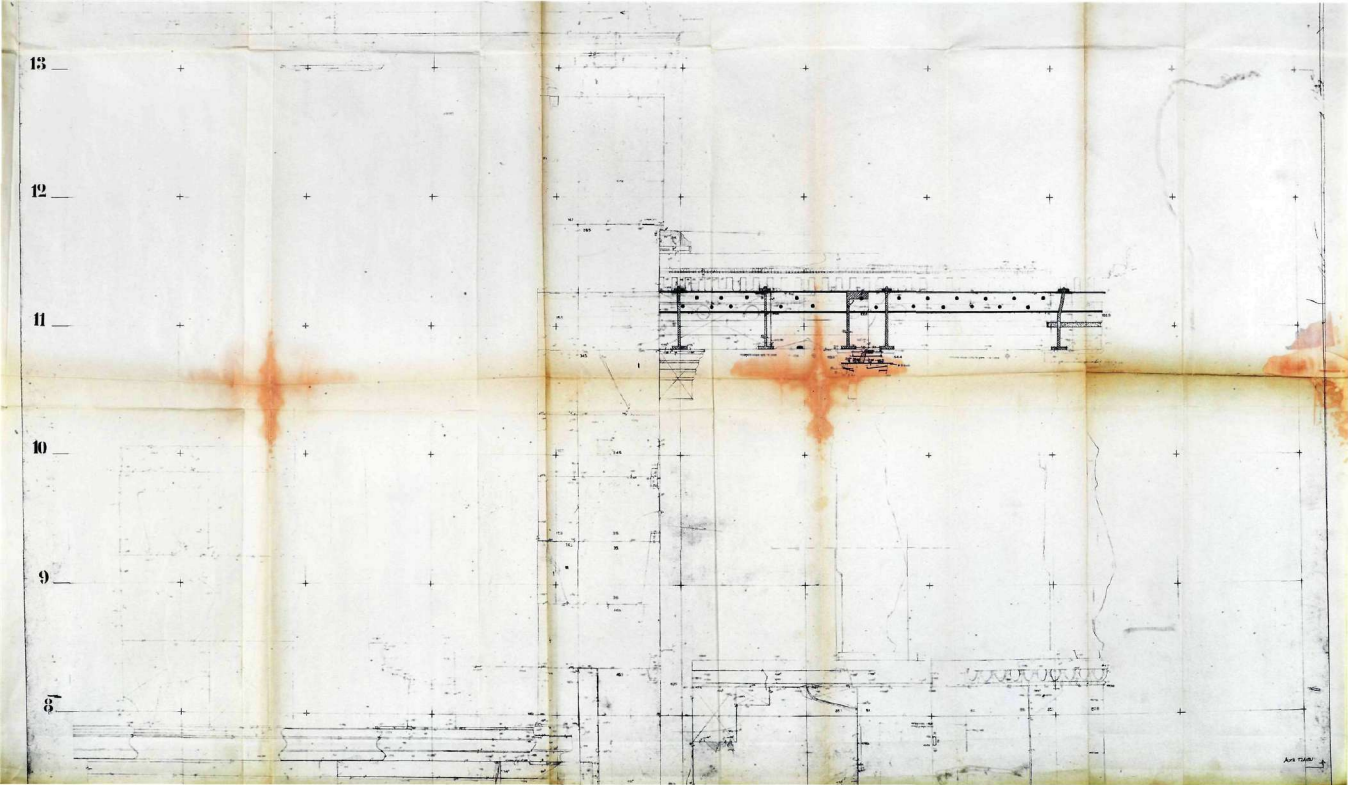
13
12
11
10
9
8

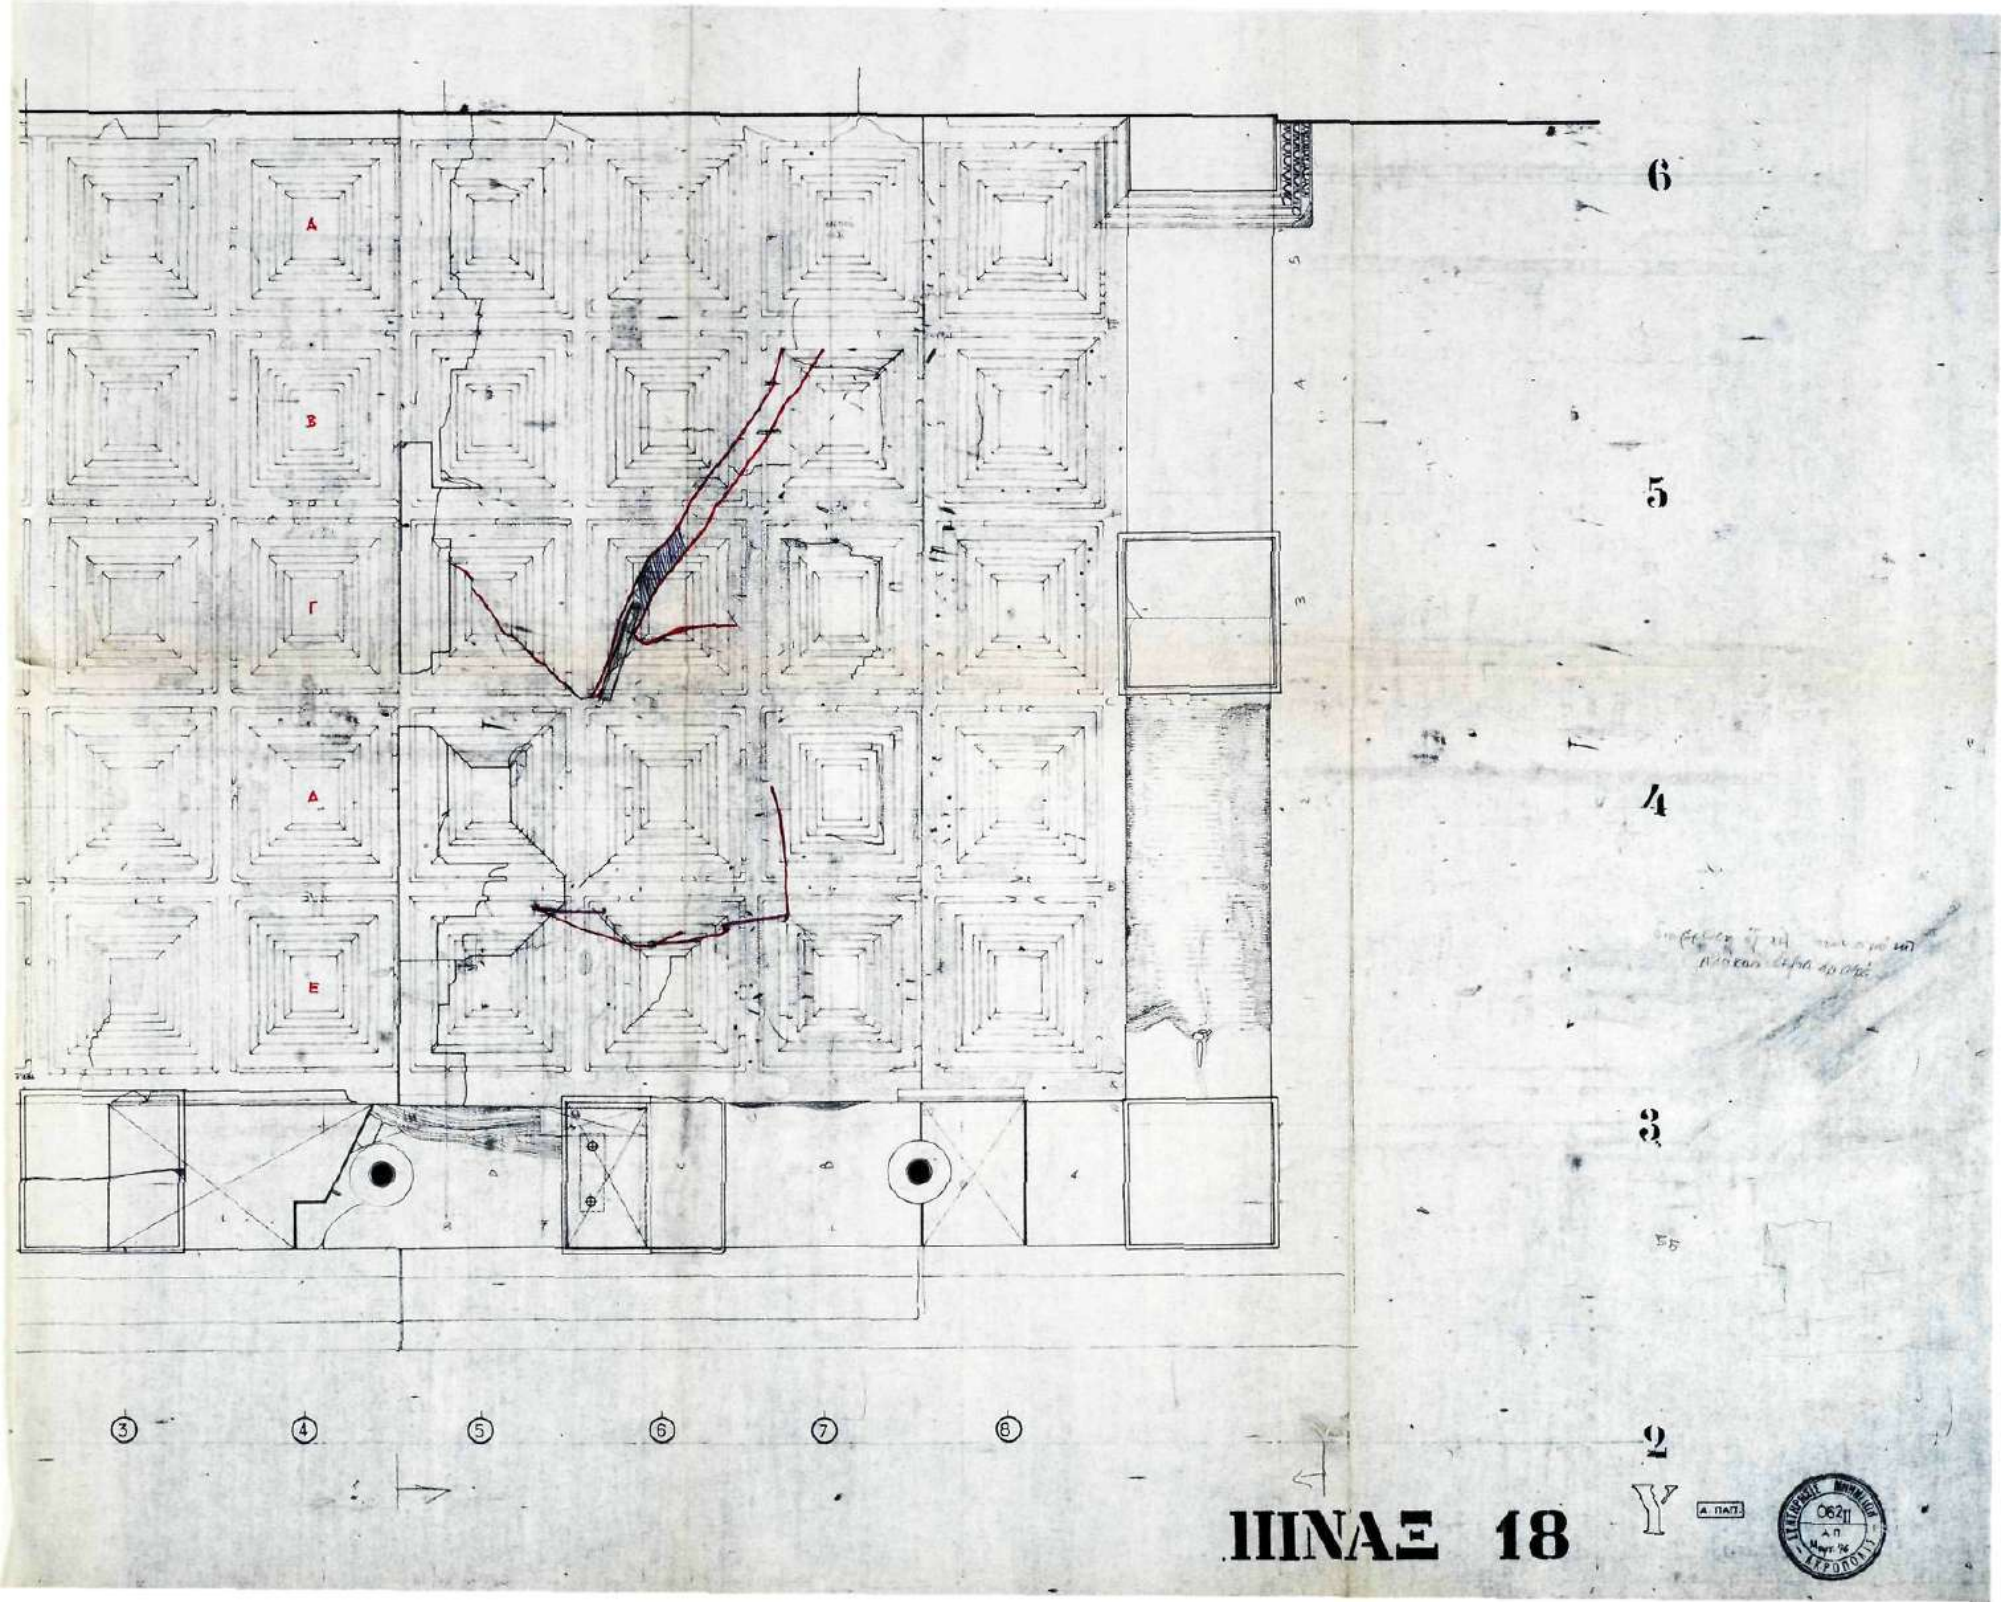
6
5
4
3
2
Α
Β
Γ
Δ
Ε
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Υ
Α. ΠΑΠΣ.
ΠΙΝΑΞ 18

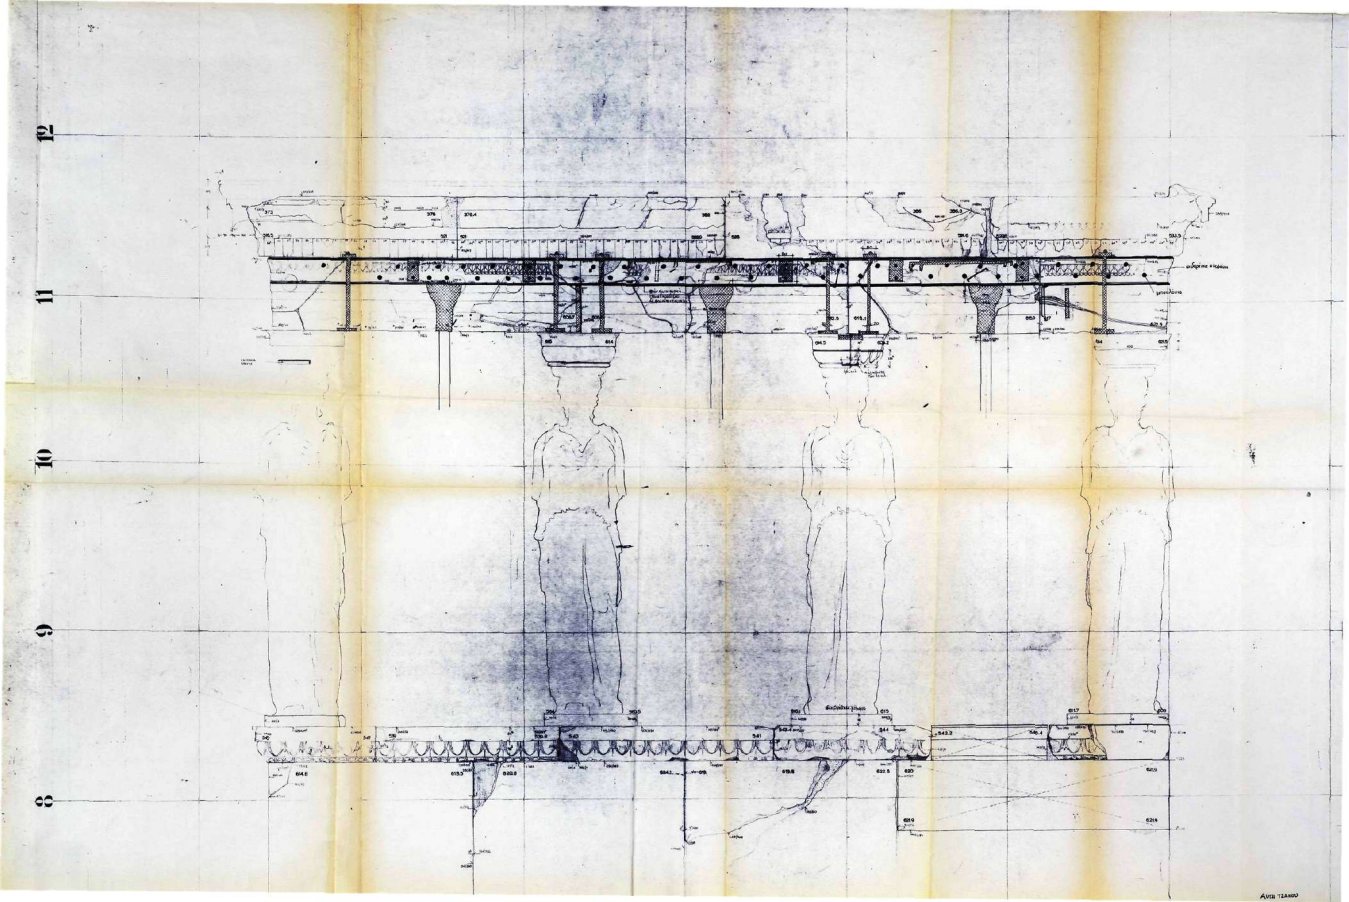
12
11
10
9
8

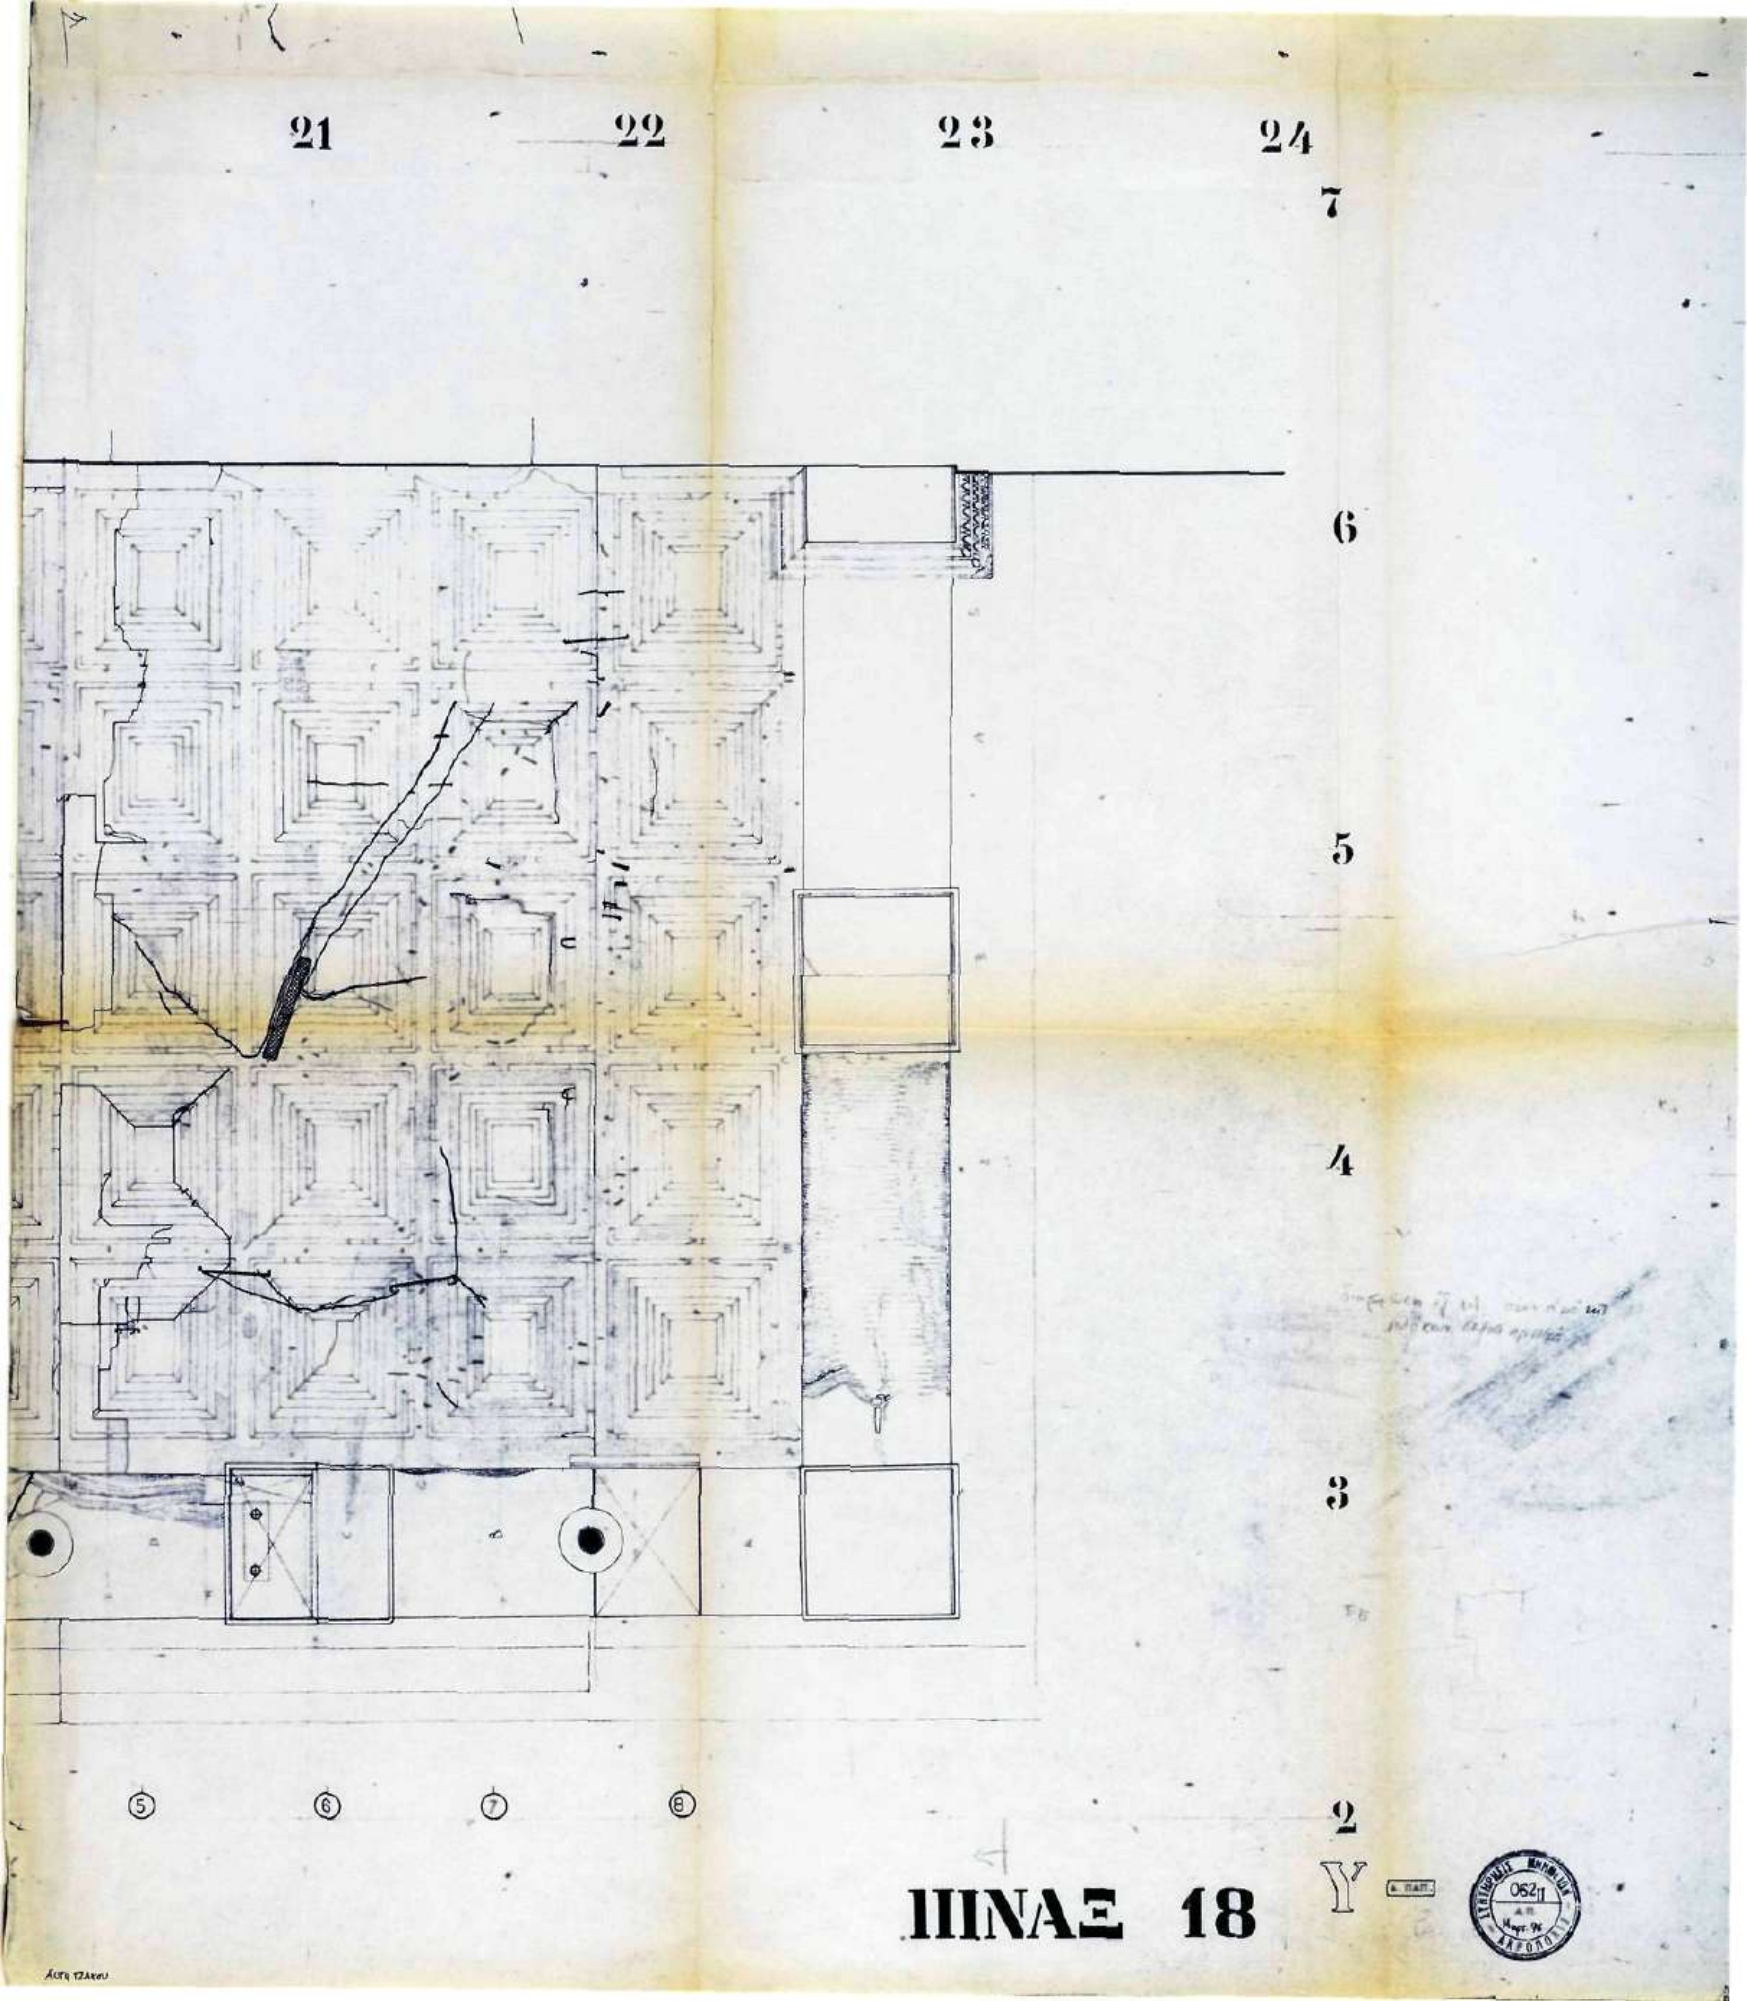
21
22
23
24
7
6
5
4
3
2
5
6
7
8
ΠΙΝΑΞ 18
Y

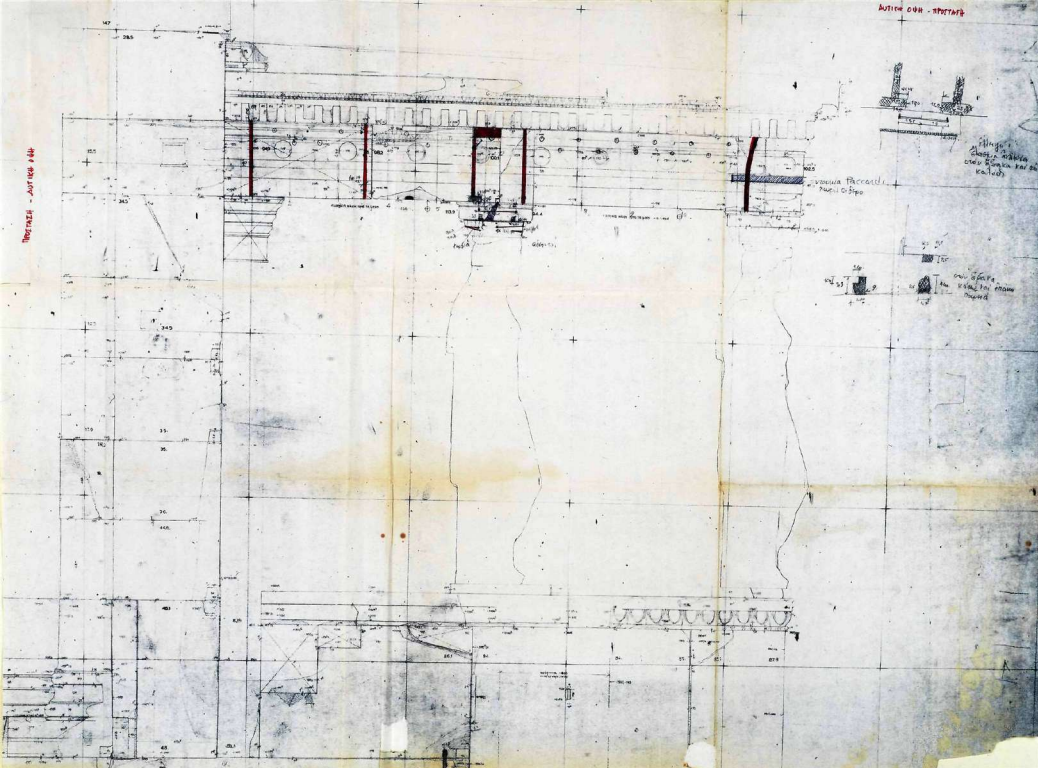
ΔΟΤΙΚΗ ΟΔΗ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΤΟΥΤΗΣΗ - ΔΟΤΙΚΗ ΟΔΗ

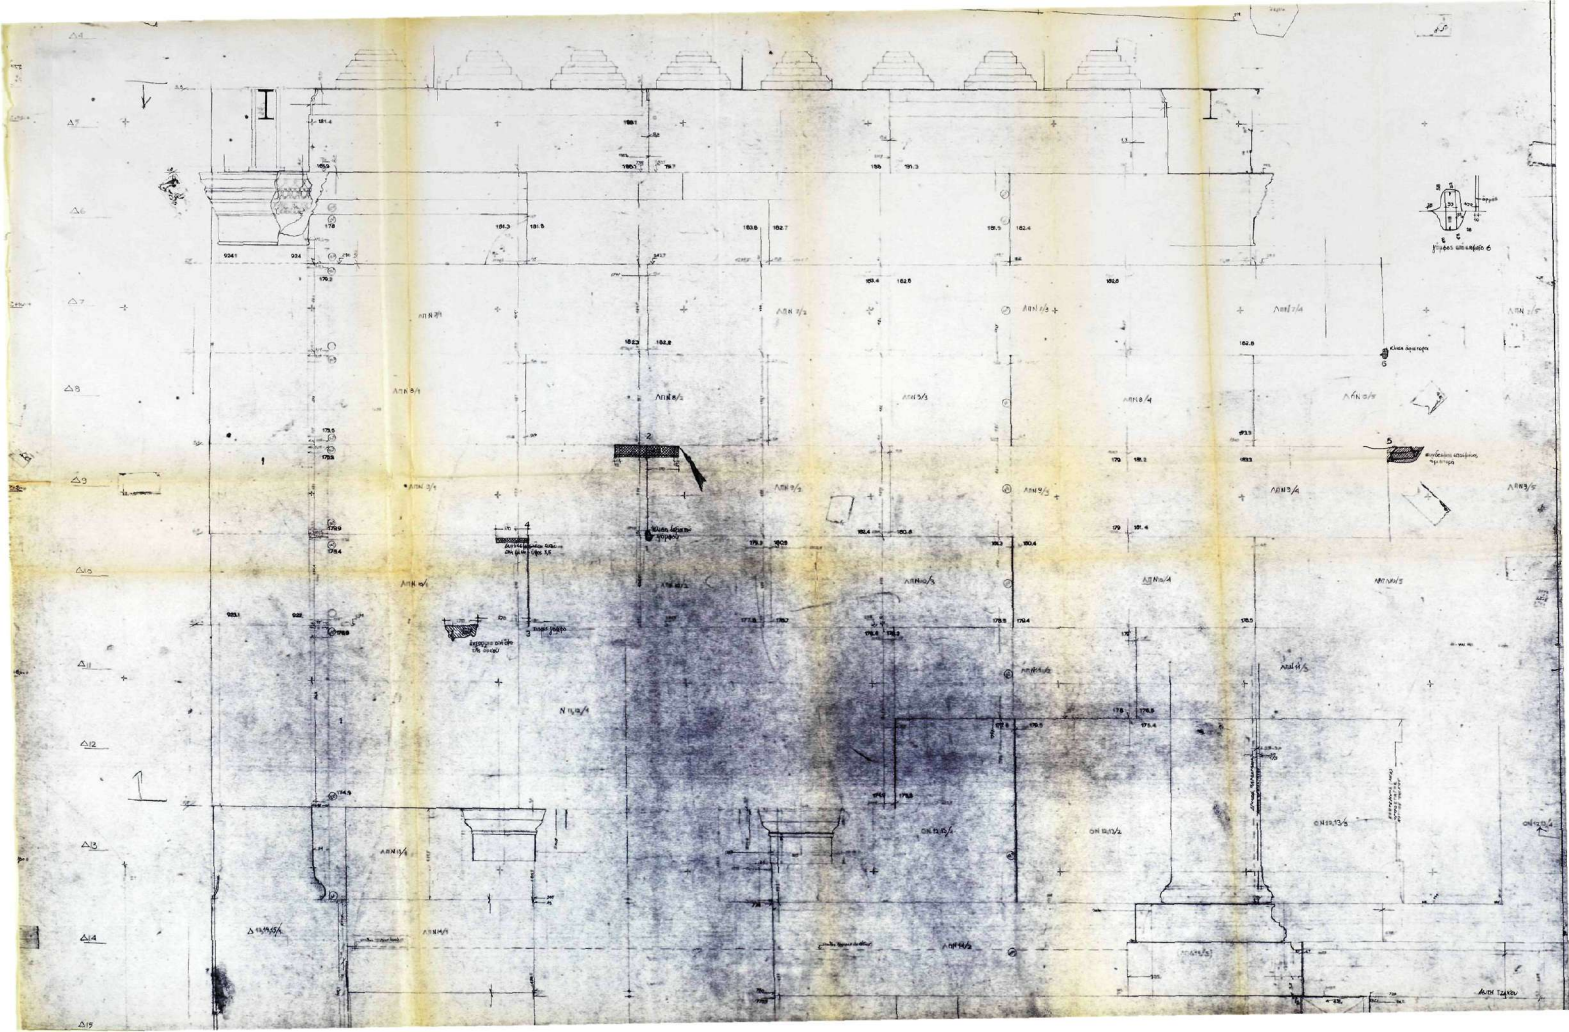

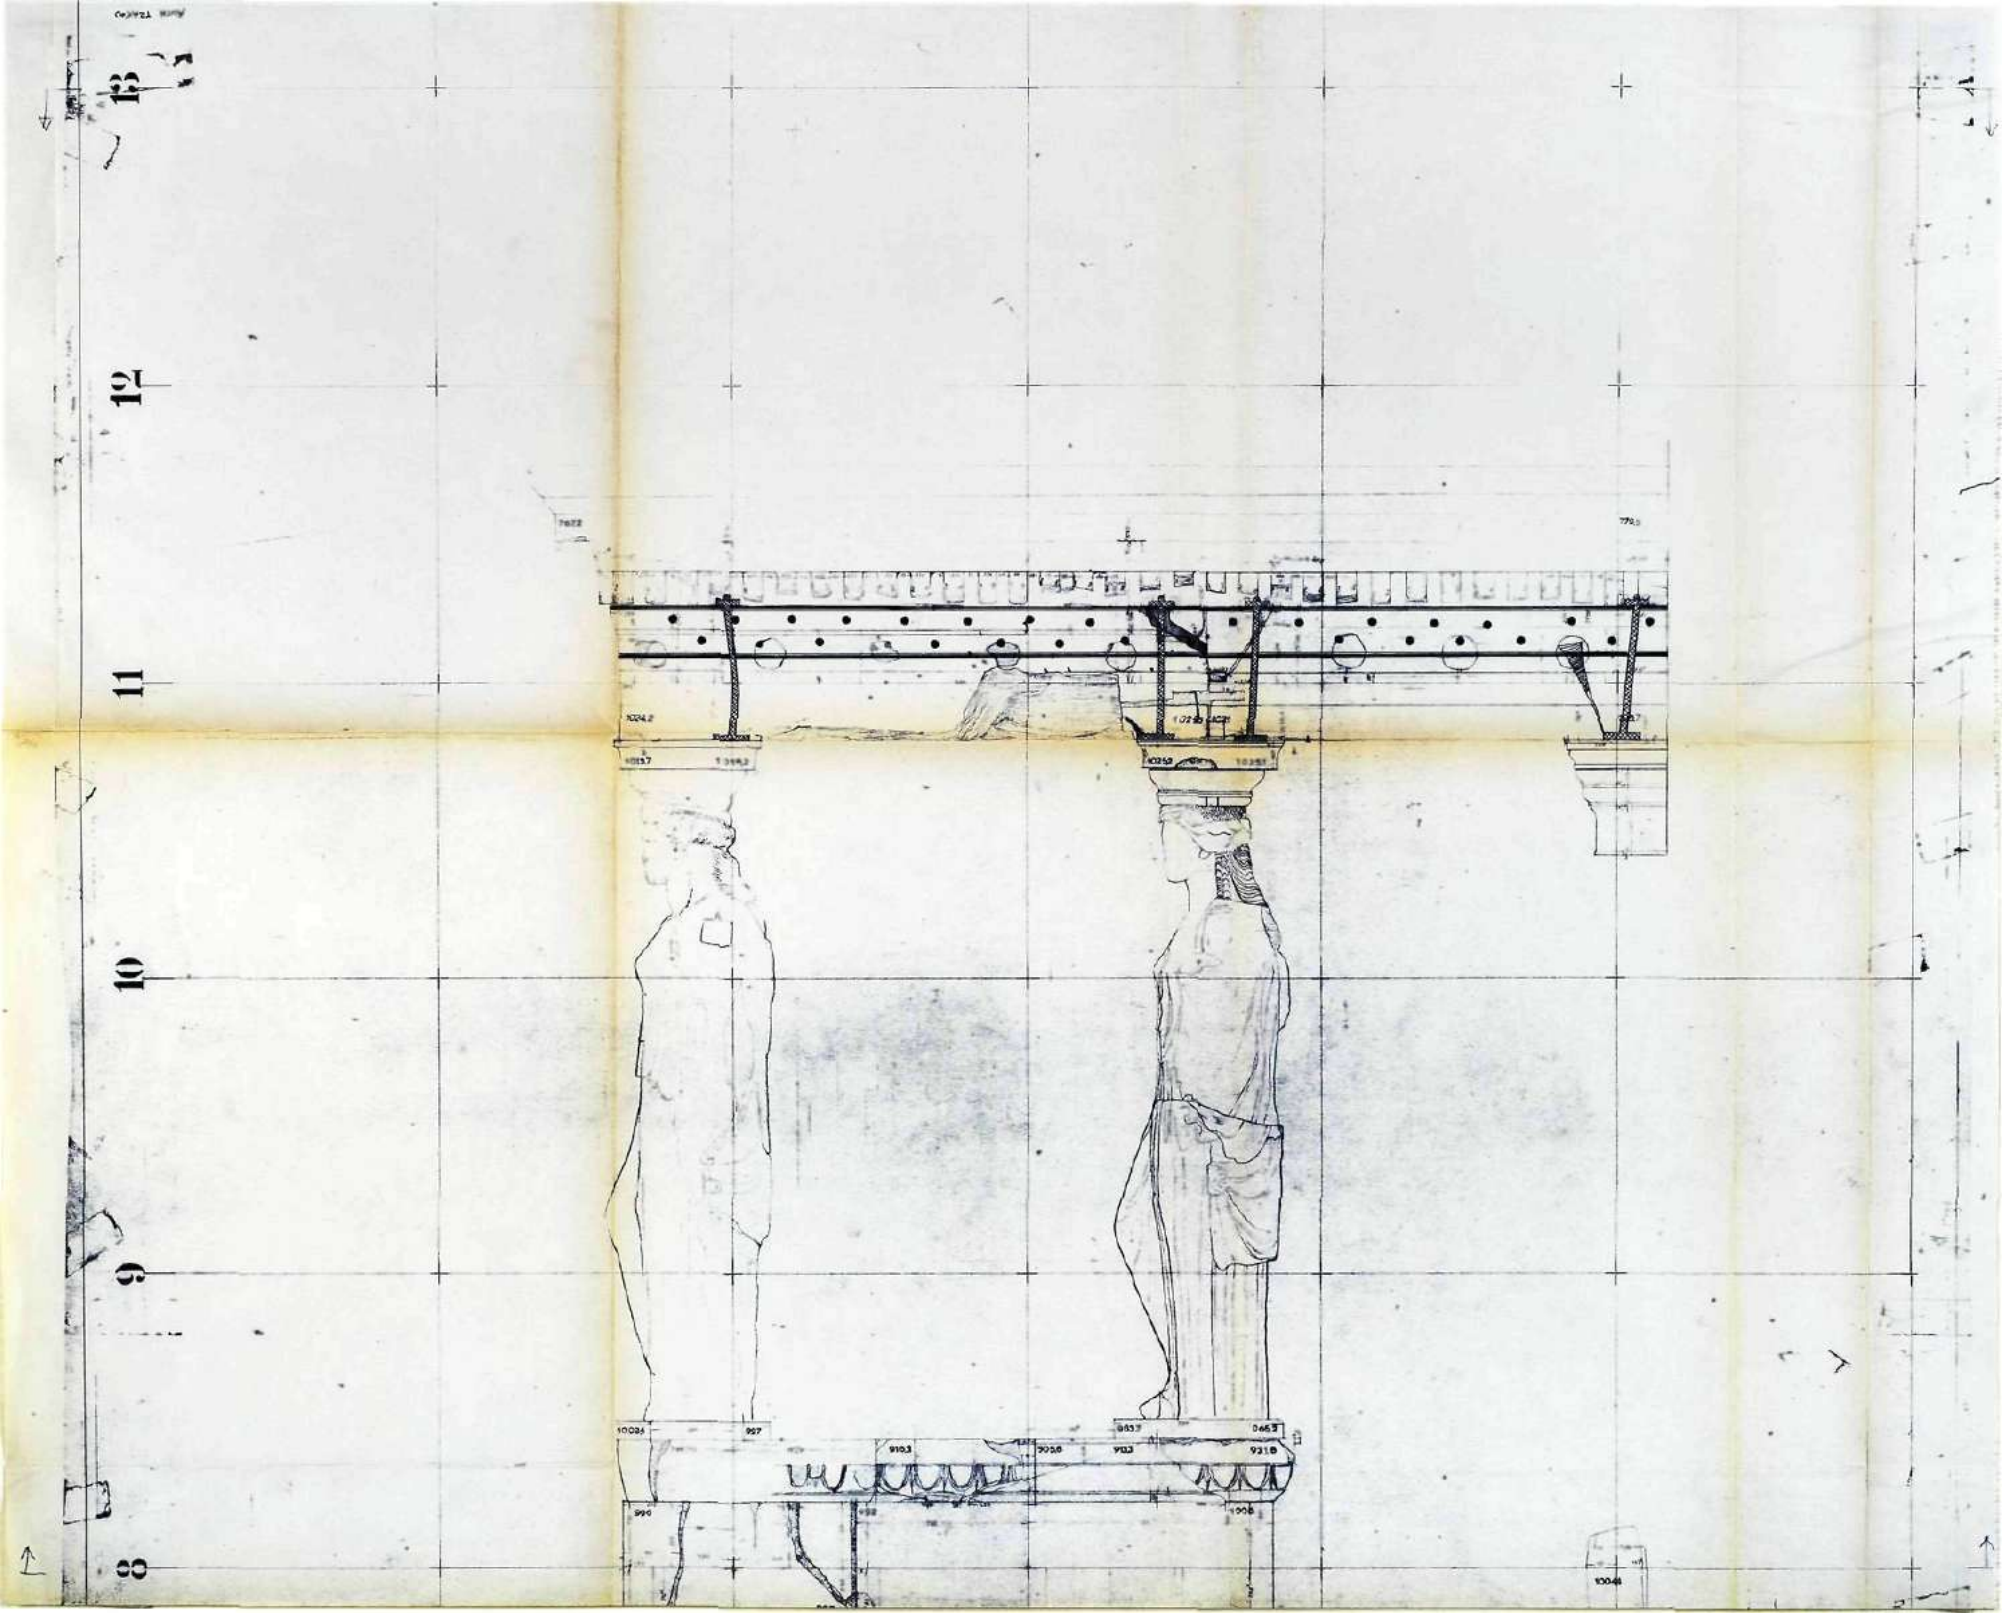
13
12
11
10
9
8

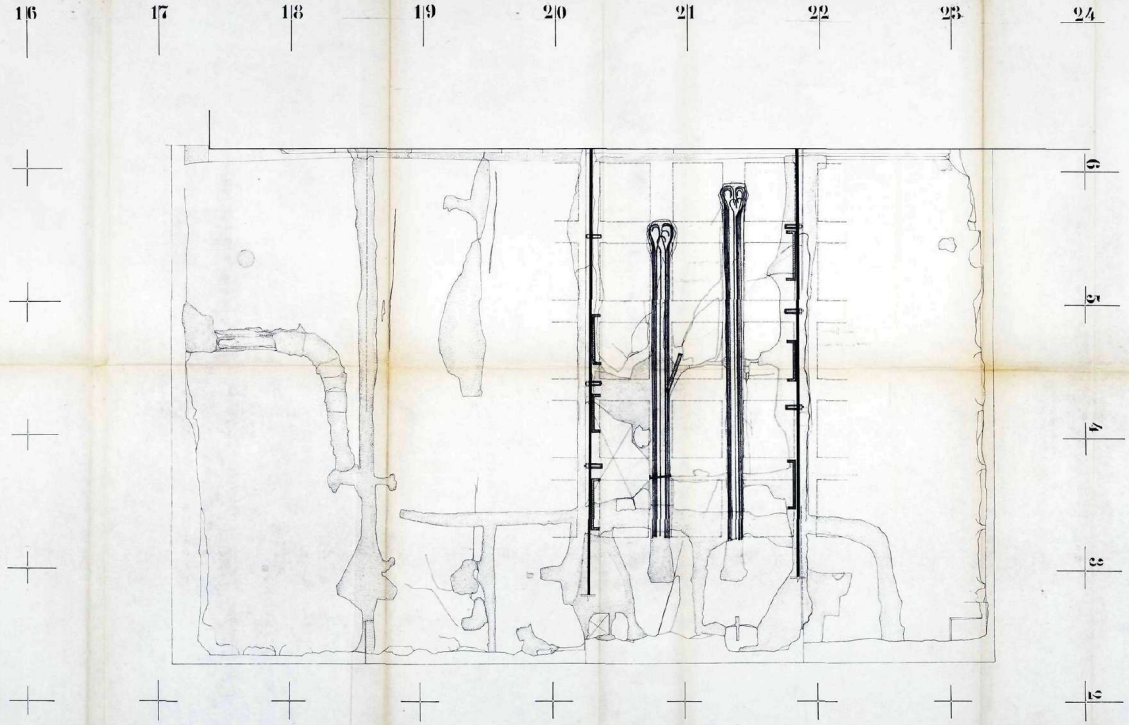

427
ATHM

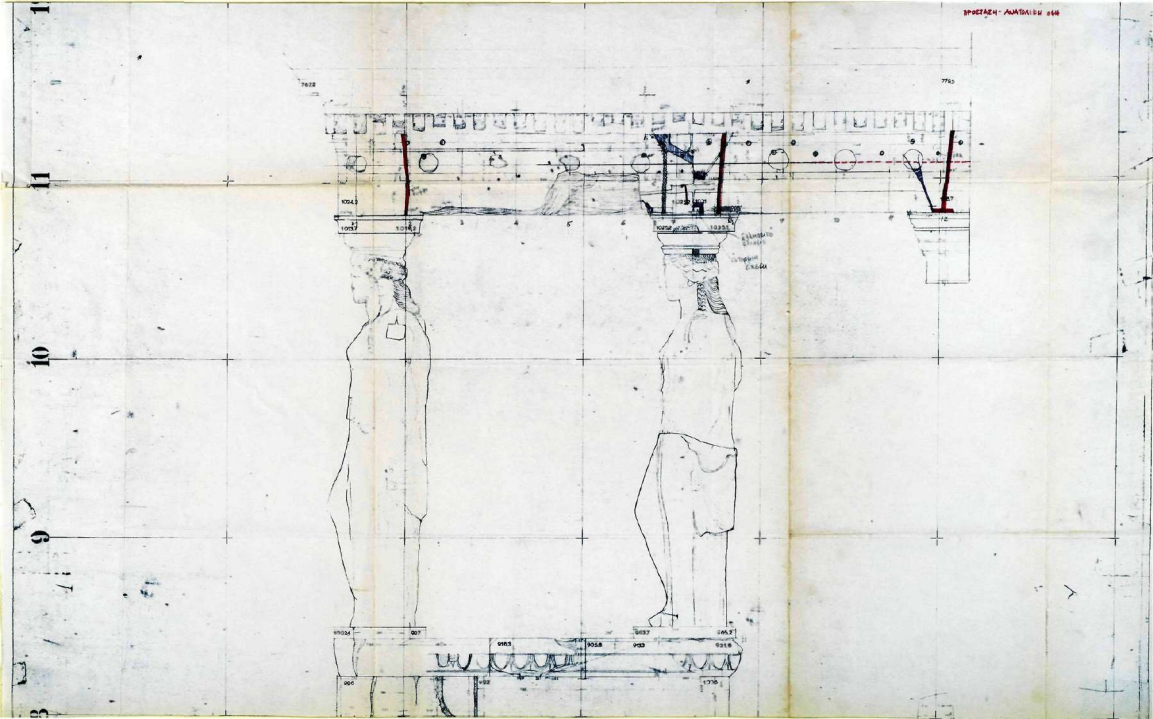
ПРОСТАЕМ - АЛМАЗИЛИ 244
11
10
9
8
7622
7763
10243
10237
10242
10232
10233
10234
007
9183
9058
9037
9027
9318
1776

29 30

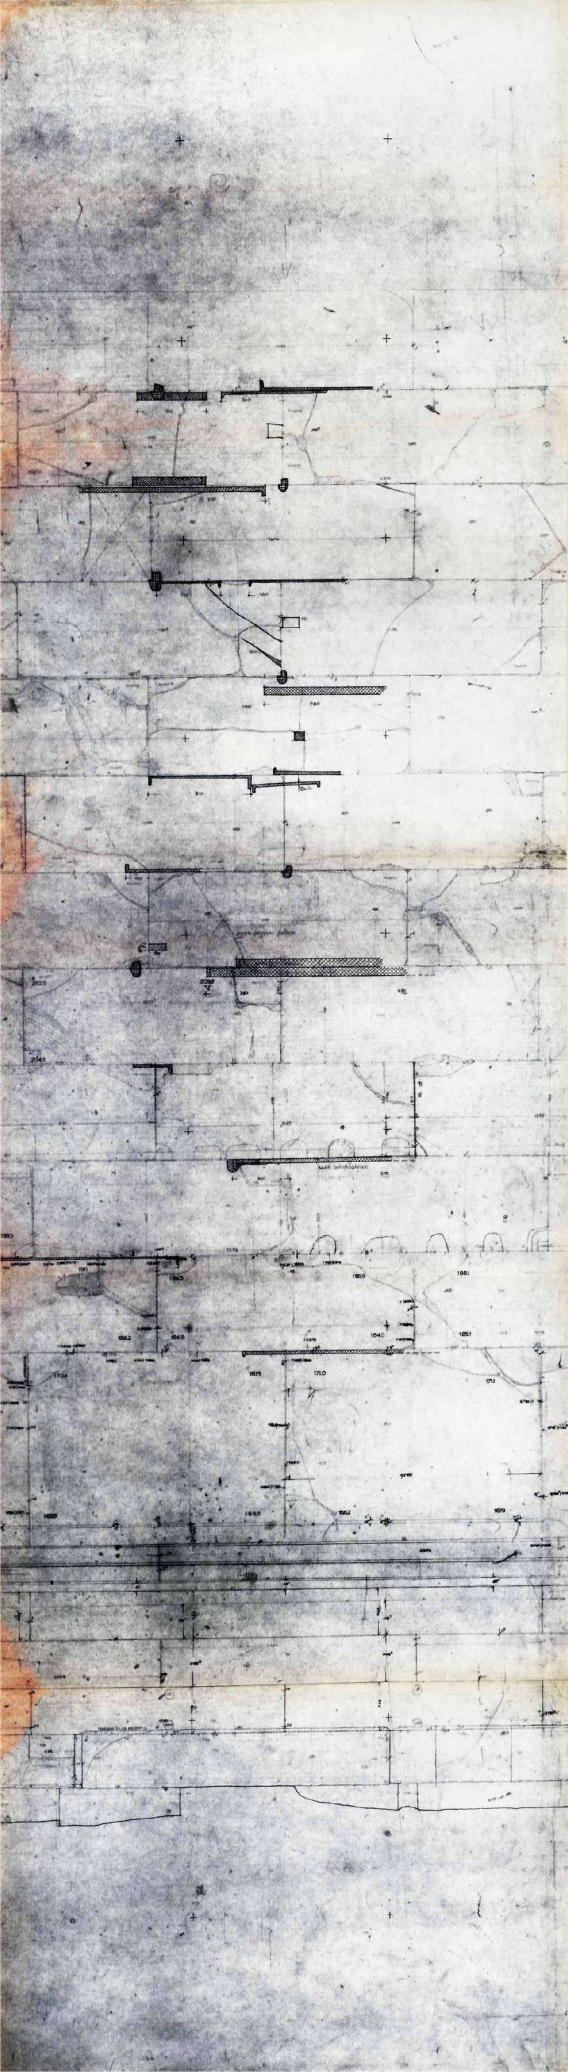

ΠΟΤΙΟΣ ΤΟΥΛΟΣ

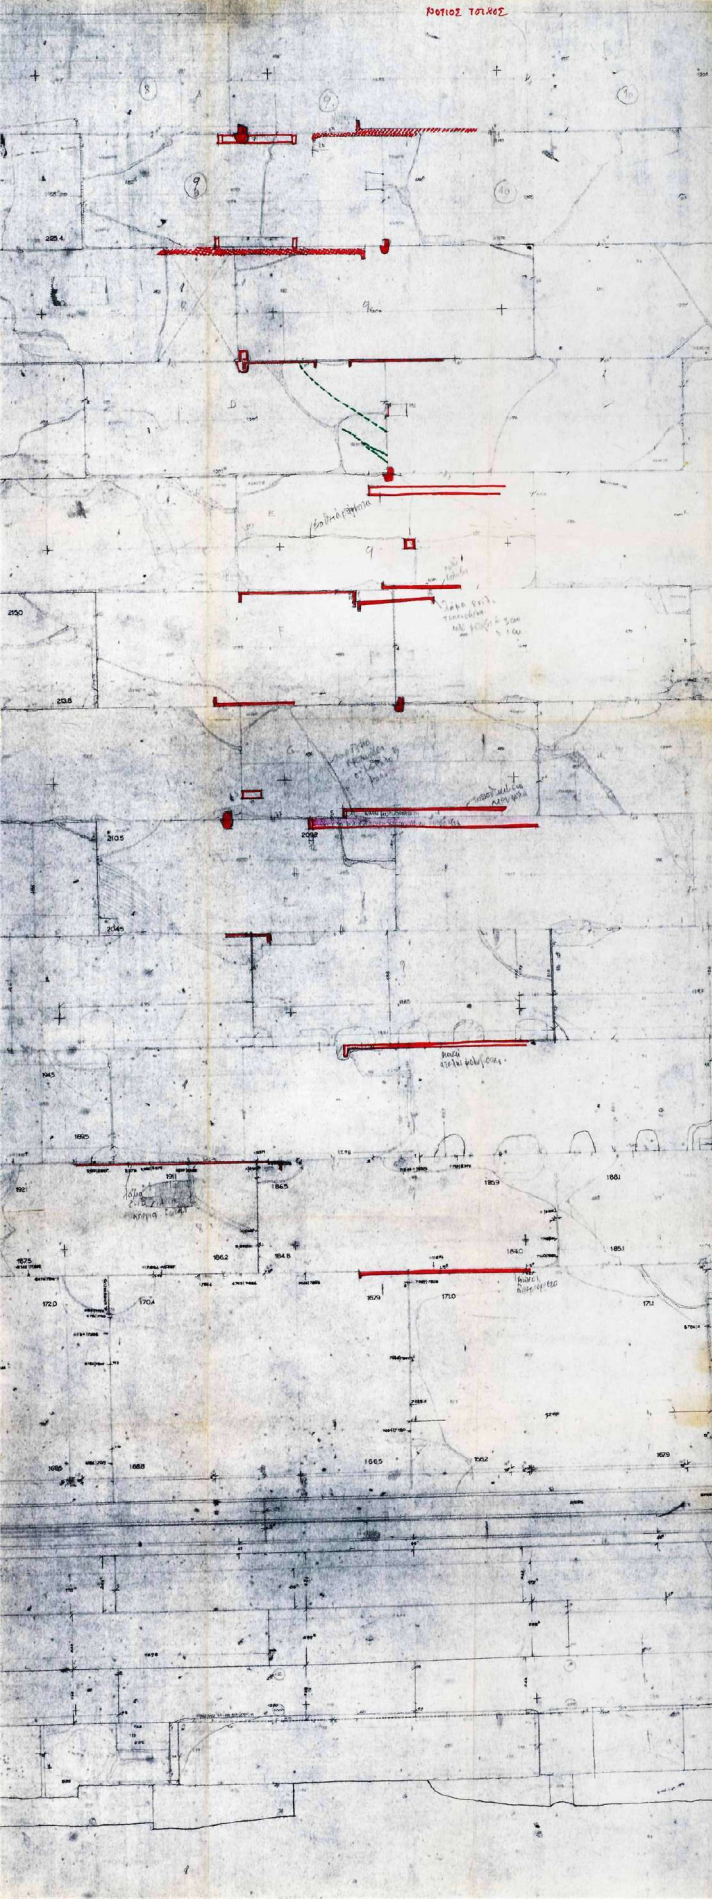

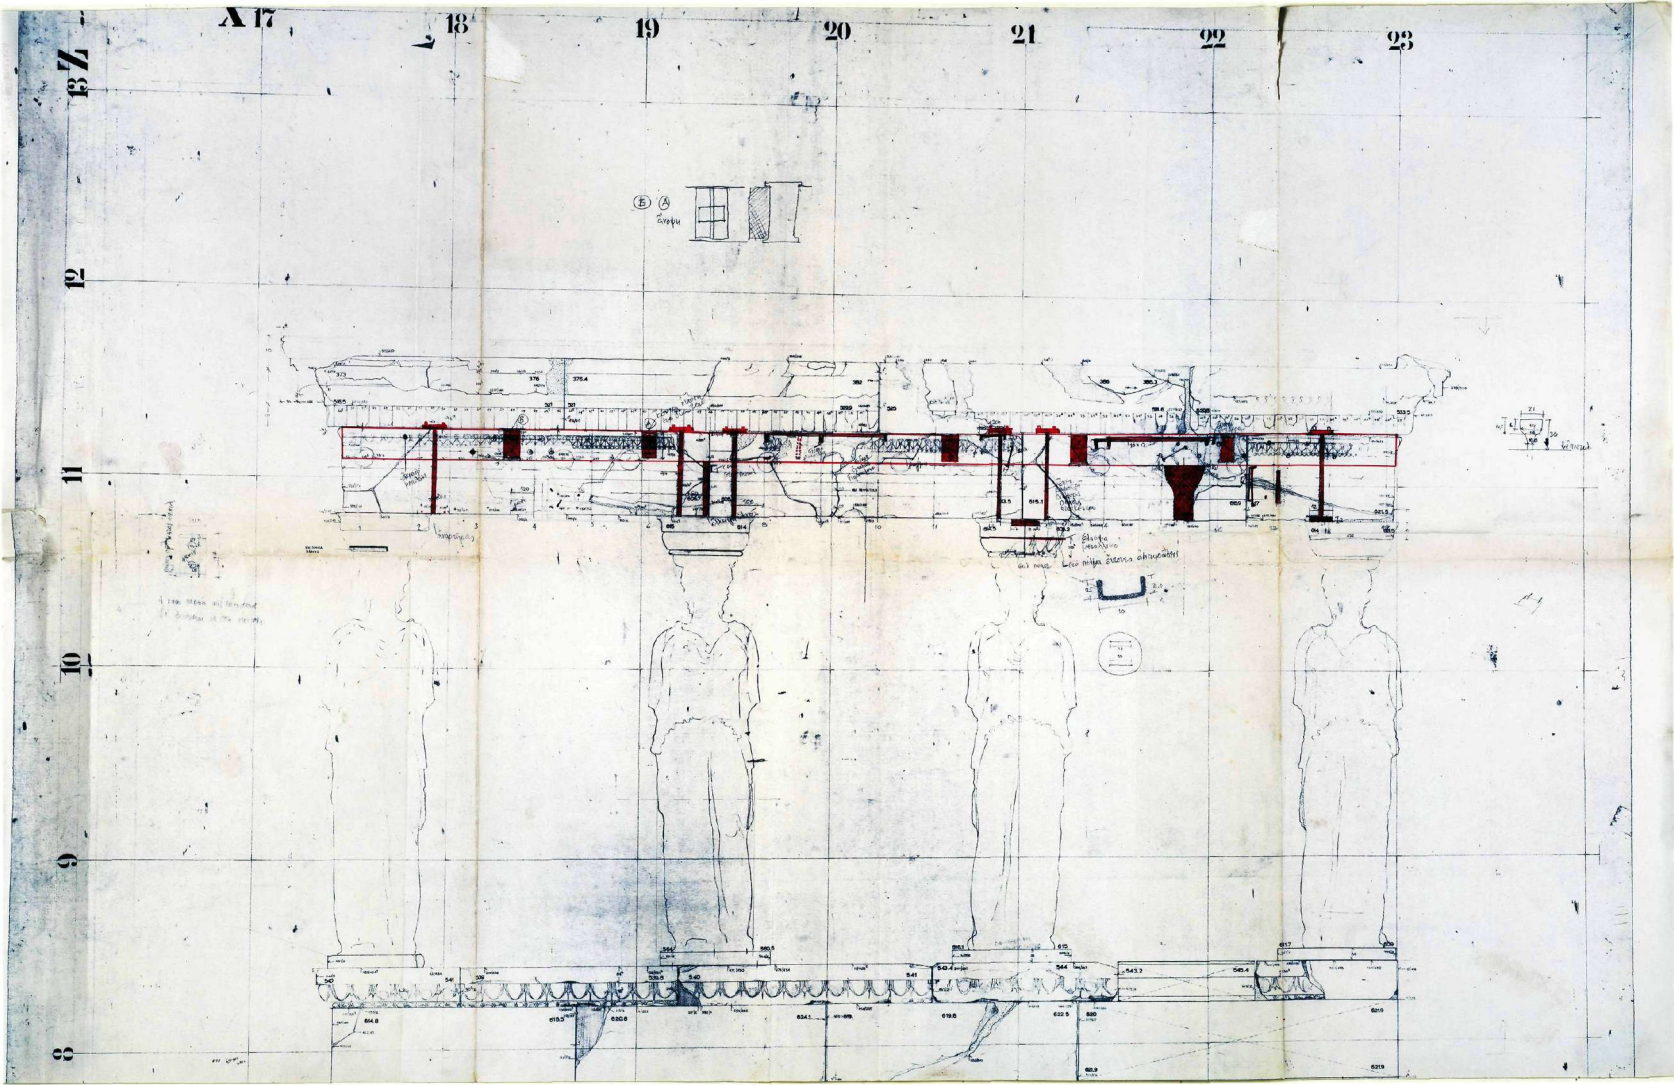
X 17
18
19
20
21
22
23
Z 13
12
11
10
9
8
